



PRECIOS PROMEDIO EX- ANTE Y EXPOST POR NODO DE ENLACE

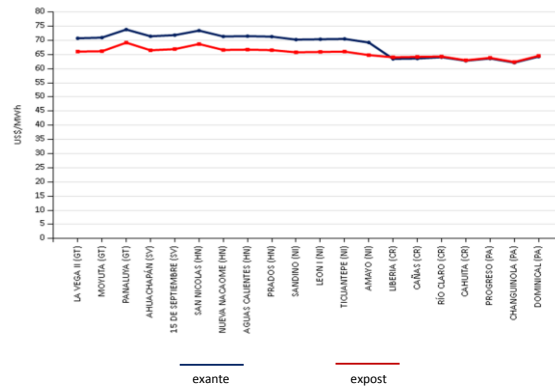


INYECCIÓN Y RETIRO DE ENERGÍA POR PAÍS EN EL MER

Mercado de Contratos Regional (MCR)

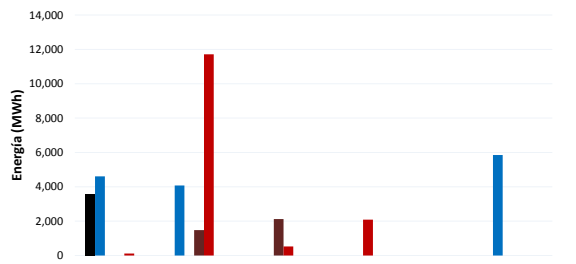


Mercado de Oportunidad Regional (MOR)

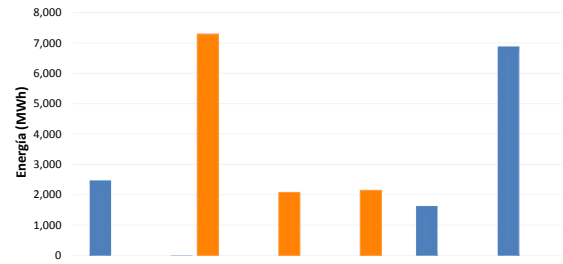


Operación	Guatemala	El Salvador	Honduras	Nicaragua	Costa Rica	Panamá	Oferta	Guatemala	El Salvador	Honduras	Nicaragua	Costa Rica	Panamá
Inyección CF	3,594	0	0	0	0	0	Inyección	2,467.4	5.0	0.0	0.0	1,623.9	6,881.7
Inyección CNFFF	4,611	4,081	0	0	0	5,847	Retiro	0.0	7,284.6	2,077.1	2,145.0	0.0	0.0
Inyección CRPS	0	0	0	0	0	0							
Retiro CF	0	1,480	2,124	0	0	0							
Retiro CNFFF	120	11,709	525	2,092	0	0							
Retiro CRPS	0	0	0	0	0	0							

* CNFFF contiene las Ofertas de Flexibilidad

MCR vs MOR



MCR



EVENTOS EN EL SER

FECHA INICIO	FECHA FINAL	SUCESO	EQUIPOS INVOLUCRADOS	OS/OM	DESCRIPCION DEL EVENTO O FALLA	ESTADO/EFEECTO	COMENTARIOS/OBSERVACIONES	CAUSA
10/06/2016 11:02	10/06/2016 11:03	Variaciones SER	Planta H. Reventazón, C.R.	ICE	Pruebas de rechazo de carga en las unidades de P.H. Reventazón, conformadas por pruebas con 220.00 MW	EOR maneja las desviaciones resultantes como desviaciones normales.	Pruebas de unidades 3,4 y 5 de Reventazón; Área de control de Panamá reporta que la frecuencia bajo a 59.7559 Hz.	Se produce al momento de la realización de pruebas de rechazo de carga de 220 MW en Reventazón, Costa Rica.
13/06/2016 08:37	13/06/2016 08:55	Disparo/variaciones	Interconexión 400 kV Guatemala (Los Brillantes) - México.	AMM/CFE	Disparo de interconexión Guatemala - México	EOR maneja las desviaciones resultantes como desviaciones normales.	disparo transferido desde México debido a baja frecuencia en el sistema mexicano	ingreso de carga industrial área México.
13/06/2016 14:51	13/06/2016 15:00	Disparo/variaciones	Línea de Transmisión Los Brillantes - La Esperanza	AMM	Disparo de línea de transmisión.	EOR maneja las desviaciones resultantes como desviaciones normales.	Variación de intercambios con México y el SER por pérdida de 176.28 MW de carga y 38 MW de generación en Guatemala. El intercambio con el SER varió de 87.36 a 92.10 de 99.65 MW programados. El intercambio con México varió de 15.51 a 161.76 de 0 MW programados	por falla temporal, pendiente informe final.
16/06/2016 12:11	16/06/2016 12:11	Variaciones SER	Planta H. Reventazón, C.R.	ICE	Pruebas de rechazo de carga en las unidades de P.H. Reventazón, conformadas por pruebas con 220.00 MW	EOR maneja las desviaciones resultantes como desviaciones normales.	la frecuencia registrada en los PMU del EOR descendió a 59.882 Hz	Se produce al momento de la realización de pruebas de rechazo de carga de 220 MW en Reventazón, Costa Rica.

Datos correspondientes a la semana del 10 al 16 de junio 2016. Elaborado con información de la Base de Datos del EOR.
